



## 寒工高改築工事かわら版

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

第36号

## グラウンドの排水管敷設作業を開始しました



(上写真) R7.3.25南側上空より

新年度が始まり半月が経ちました。寒河江市内の桜の名所は間もなく見頃をむかえるところでしょうか。寒河江工業高校は4月8日に入学式が行われました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます。輝くエンジニアになるため頑張ってください。

さて、現場の方は、グラウンド外周ランニングコースの舗装路盤敷込み作業と、グラウンド全体の路床不陸調整作業を進めています。また、今月から、グラウンドの水捌けを良くするための、暗渠排水管敷設作業を開始しました。

重機作業による騒音や振動、大型車両の出入りが続きますが、安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

寒工高の桜  
今年もきれいに咲きました

## 【グラウンド工事の工程】

近隣住民の方から、「グラウンドの工程を教えてほしい」というご意見がありましたので、今月のかわら版では今後の工事の工程を説明したいと思います。

〔4月〕 ランニングコースの縁石と舗装路盤、グラウンドの不陸調整と排水管敷設作業を行います。

〔5月〕 外周の防球ネットの支柱建込み作業を行います。また、排水管敷設が完了した部分からグラウンドの路盤敷込み作業も行います。

〔6月〕 グラウンドの路盤敷込みと表層仕上作業を開始します。テニスコート、ハンドボールコートの排水管敷設作業も行います。


〔7月〕 グラウンド表層仕上作業と防球ネットの張込み、ランニングコースの舗装、各コートの路盤敷込み作業を行う予定です。

それと現在の乗入口を閉鎖する作業も行います。そのあとは西側合宿所付近から出入りします。


〔8月〕 グラウンド、各コートの仕上作業、北側境界のフェンス設置作業の予定です。駐車場の路盤敷込みも行う予定です。

〔9月〕 塁ベースやブルペン、各競技のポイント、コートライン等の設置、防球フェンス設置を行います。駐車場の舗装で現場作業は完了します。中旬から引渡しに向けた検査を受け、10月から供用開始できるように進めていきます。

## ◆工程表

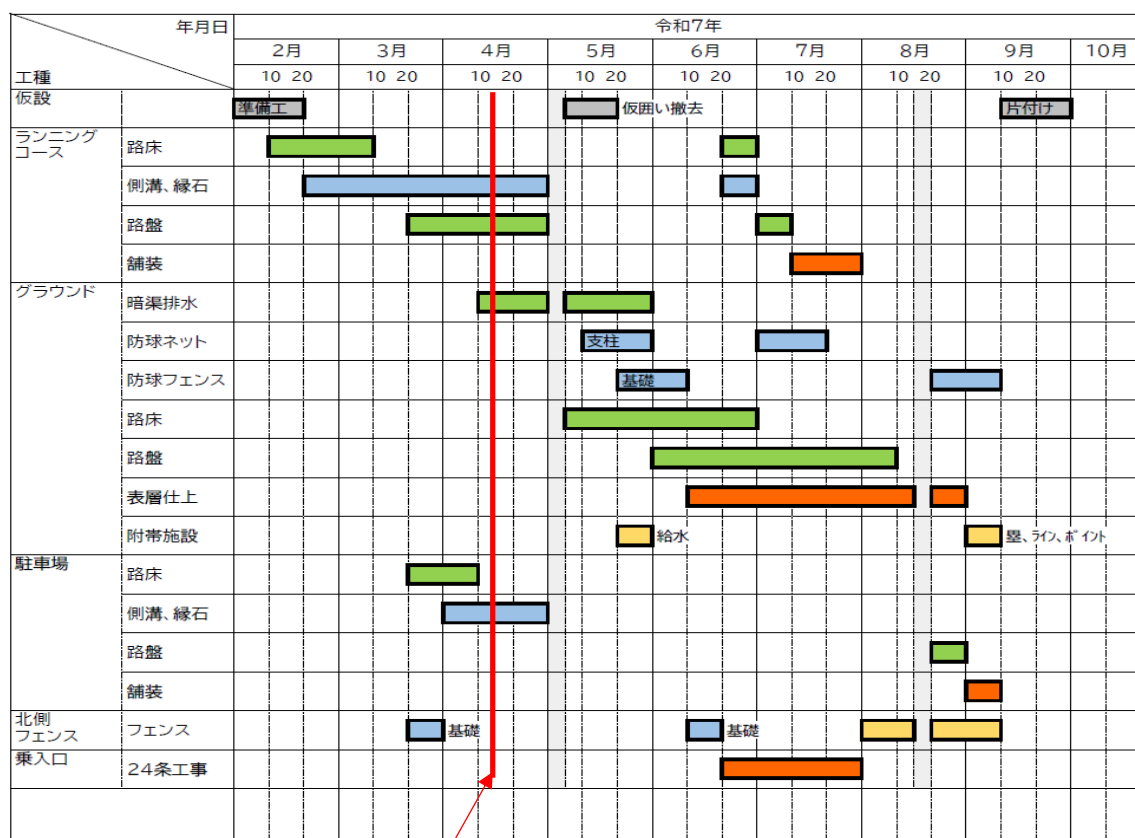

## ◆概略図

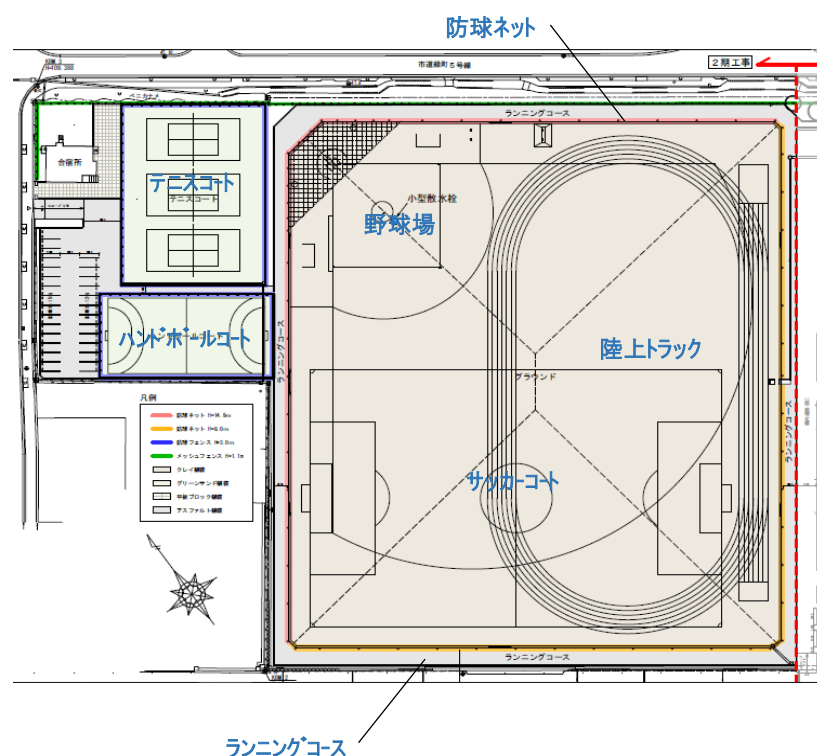

※グラウンド工事は、屋外での作業のため、天候や気温等により、予定していた工程が前後する場合があります。

4/15現在

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



## 4～5月の工事予定

4/継続

4/継続

4/初～

5/3～5/6

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。

グラウンド路床工事

ランニングコース縁石、路盤敷込み

グラウンド暗渠排水工事

GW現場休工
