



# 山工高・体育館工事かわら版

工事についてお気づきの点がありましたら、右記にご連絡ください

## 第 3 号

平成29年10月  
升川建設・市村工務店JV  
山形市緑町地内  
☎023 (673) 0894

### 基礎工事完了し1階躯体工事へと進みます。




基礎工事完了した部分から埋戻し開始  
10月25日ドローンにて撮影

10月20日に県会計局工事検査課による中間検査を受検し無事合格を頂きました。10月30日のコンクリート打設で基礎コンクリートの打設が終了しました。11月は1階床工事～1階躯体工事へと進めてまいります。今後も安全作業・品質管理に努めてまいります。

10月は2週連続で大きな台風が日本を襲い各地で被害が出ていますが、幸い山形県は大きな被害が無く安堵しているところです。今後も災害が無いことを祈るばかりです。


私達も山工の現場で働いています。

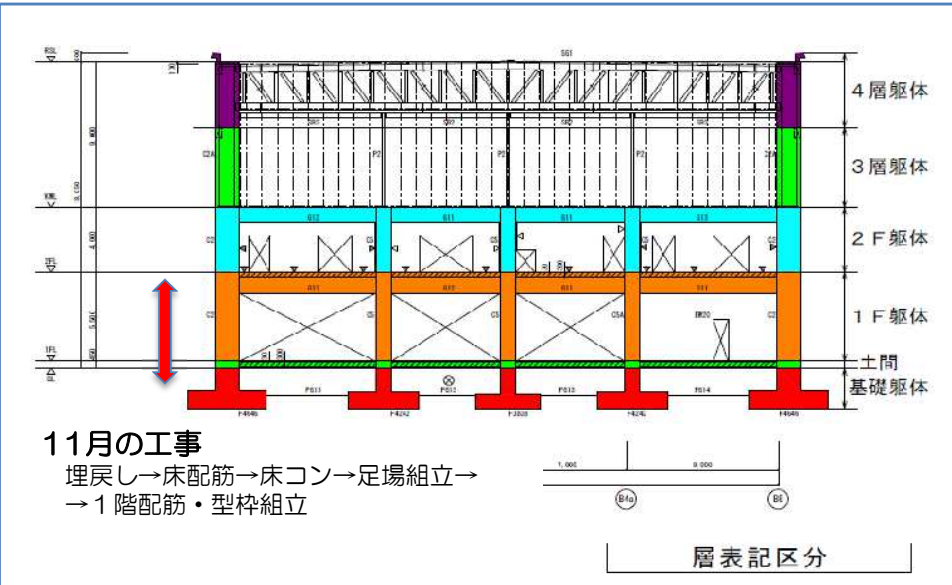

今埜さん  
山有誠警備保障㈱  
ゲート前で交通誘導を行っ  
ています。



石川さん  
㈱上東建設  
ダンプを運転しています。

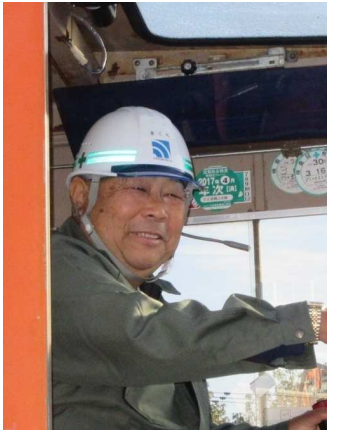

菊池さん  
升川建設㈱  
クレーンを運転して  
います。

こうした皆さんがこの現場の安全を守ってくれています。  
『絶対安全』で工事を進めます。

10月27日 建築システム科3年生39名の現場見学会が行われました。

10/24 見学会 4名



山工体育館工事現場は、目に見え、記憶に残る 最高の授業の場です。

**建築用語豆知識**  
 ……ジャンカ(豆板)…  
 コンクリートが完全に充填されて  
 いない状態

……パイプレーター…  
 ジャンカを出さないように  
 コンクリートを十分に充填  
 する機械

皆さんは、入学当初から山工校舎改築の工事の様子を見てきたと思います。建物が実際にどのようにして建てられていくのか、目で確認し授業と照らし合わせ自分の記憶に残す。将来建築に携わる皆さんにとっては本当にいい経験ができたのではないのでしょうか。この3年間の経験は社会人になった時に必ず生きてきます。立派な建築屋になって下さい。

