

# 寒工高改築工事かわら版

工事についてお気づきの点がありましたら、右記にご連絡ください。

第39号

## グラウンドの表層材敷き込み作業と防球ネット張り作業をしています




(上写真) R7.6.27南側上空より

### ◆グラウンド工事の作業状況

防球ネット支柱の建て込みが完了したところから、金物を取り付けて、ワイヤーを設置しネットを張っています。グラウンドのクレイ舗装は、路床の高さを調整しながら敷き均し、路盤碎石を敷き込みして終わったところから、表層材の敷き込み作業を行います。外周のランニングコースもアスファルト舗装の段取りをし、月末から順次舗装をしていきます。

#### 【グラウンド路床、路盤工】

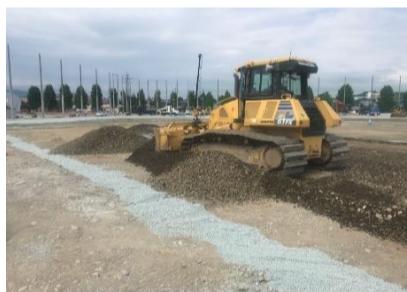

グラウンドの下層を敷均し



転圧し、たわみがないか確認



路盤碎石を敷均し、転圧



碎石の厚さを確認します



#### 【防球ネット張り】



支柱に金物を取付けます



金物にワイヤーを張り、ワイヤーにネットを張り付けます



整地作業をしているブルドーザーは、ICT技術を活用し三次元データとGPSなどの衛生測位システムで、ブレードを自動制御して高精度な整地作業を行っています

### ◆グラウンドの表層材が決定

グラウンドの仕上となる表層材を、教育局と学校の先生、監理者の立会いで決めて頂きました。表層材には良質土やクレイ素地、砂を3種類混合したものを使用しますが、材質や分量で硬さや水捌けが変わります。今回は試験場で7パターン配合試験をした中から最良の2パターンを選び、そこから決めて頂きました。

### ◎ご連絡

現場の進捗により現場事務所を撤去しました。それに伴い、事務所の電話もなくなりましたので、お気づきの点は、升川建設株本社 0237(73)2233までお電話ください。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力を願い申し上げます。



### 7~8月の工事予定

- |       |             |
|-------|-------------|
| ~7/下旬 | 防球ネット張り作業   |
| 7/継続  | グラウンド路床、路盤工 |
| 7/中旬~ | グラウンド表層工    |
| 7/下旬~ | ランニングコース舗装工 |

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。

水分はとれるか  
意識があるか？

自分で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を！
